


宇城広域連合エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事 工事の進捗状況


令和4年3月号 Vol.6号



B-1工区（ごみピット）掘削が順調に行われています。掘削は13メートルほどの掘削を施工します。

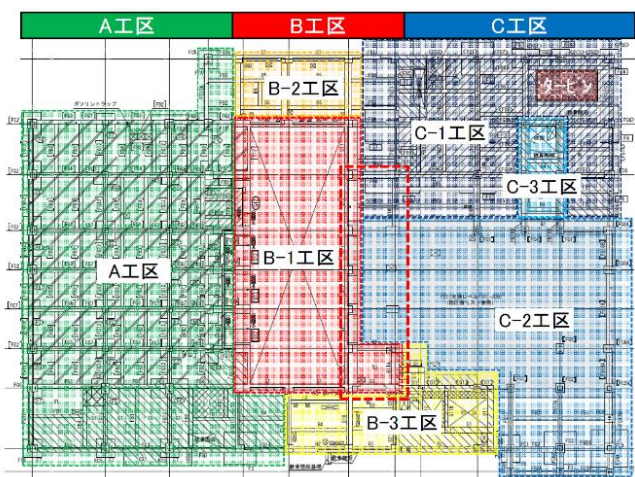

C-3工区

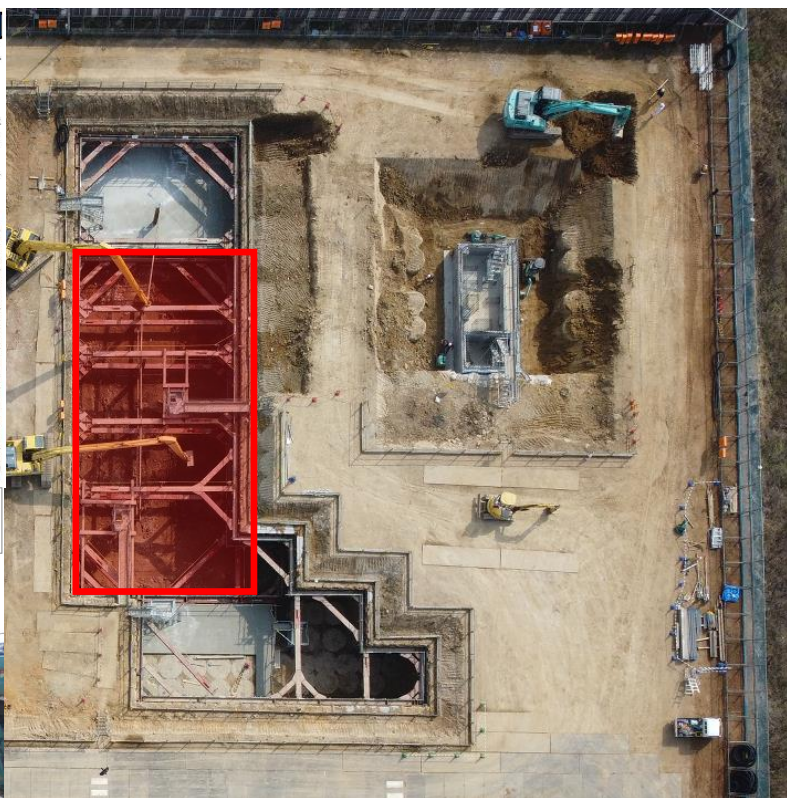

C-3工区はポンプピットにあたる場所です。ポンプピットとは蒸気タービン内等に溜まる熱水(ドレ)を回収し、再度利用する為の装置を収納するところです。

